

Informe de Seguimiento Trimestral al Plan de Acción Institucional- PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO- PES-PR

Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027: Cartagena Ciudad de Derechos

Periodo evaluado: Julio- Septiembre

Fecha de presentación: 14/10/2025

Elaborado por: Luz Marlene Andrade - Carmen Judith Herrera
Secretaría de Planeación Distrital

Contenido

1. Introducción	3
2. Avances Consolidados en Programas y Metas de Producto	4
2.1 Panorama General	4
2.2 Resultados comparativos junio- septiembre	6
2.3 Avance Programas.....	7
2.4 Análisis de Metas de Producto Estratégicas.....	8
3. Avances de Proyectos y Ejecución Financiera	9
3.1 Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión.....	9
3.2 Descripción de avance en los Proyectos de Inversión	12
3.2 Ejecución Presupuestal Global PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO	28
4. Conclusiones y Recomendaciones	28



1. Introducción

Este informe se enmarca en lo establecido por la Ley 152 de 1994, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, que establece la obligación de los entes territoriales y sus autoridades de formular y ejecutar un plan de desarrollo, así como realizar un seguimiento y evaluación periódica del mismo. El seguimiento y la evaluación son ejercicios fundamentales que permiten informar a todos los actores del territorio sobre los avances en las líneas estratégicas, los componentes impulsores de avance, los programas y las metas, con el fin de determinar el nivel de cumplimiento alcanzado en cada uno de los años del periodo de gobierno. De esta manera se presenta informe correspondiente al seguimiento y evaluación del plan de acción institucional del Plan de Emergencia Social Pedro Romero (PES-PR) a corte 15 de septiembre 2025.

El Plan de Emergencia Social Pedro Romero (PES-PR), es responsable de ejecutar en el Plan de Desarrollo “Cartagena Ciudad de Derechos, 2024-2027”, el Impulsor de Avance “Superación de la Pobreza Extrema y Soberanía Alimentaria” a cargo de 10 Programas Estratégicos en la Línea Estratégica de Seguridad Humana, para lo cual, en el presente informe, presentamos los avances de Metas Producto, Programas, Proyectos y Ejecución Presupuestal según Compromisos.

2. Avances Consolidados en Programas y Metas de Producto

Los resultados de ejecución del Plan de Acción Institucional del Plan de Emergencia Social Pedro Romero (PES-PR) a corte 15 de septiembre del 2025, están sujetos a los criterios de eficiencia que se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1. Rangos de Eficacia Planes de Acción 2025

TABLERO DE CONTROL PARA PLANES DE ACCIÓN - RANGOS POR TRIMESTRE AJUSTADOS SEGÚN EL PERIODO DE CORTE.					
Criterio de Seguimiento	Rango de Seguimiento	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Sobresaliente	90,1% - 100%	22,31% - 25%	43,3% - 50%	67,51% - 75%	90,1% - 100%
Aceptable	75,1% - 90%	18,76% - 22,3%	37,51% - 45%	56,26% - 67,5%	75,1% - 90%
Medio	50,1% - 75%	12,51% - 18,75%	25,1% - 37,5%	37,51% - 56,25%	50,1% - 75%
Deficiente	25,1% - 50%	6,26% - 12,5%	12,51% - 25%	18,76% - 37,5%	25,1% - 50%
Crítico	0% - 25%	0% - 6,25%	0% - 12,5%	0% - 18,75%	0% - 25%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital.

2.1 Panorama General

Para el corte 15 de septiembre se evidenció un avance en la meta producto al año 59.72%, ante ello se puede concluir que la dependencia avanza en el año 2025 con un nivel “Aceptable” de eficacia según los criterios de evaluación establecidos en el sistema de seguimiento y evaluación aprobado en el acuerdo 139 de Plan de desarrollo de 2024.

En cuanto a lo programado para 2025 en el plan de acción Plan de Emergencia Social Pedro Romero cierra el corte a 15 de septiembre en el cumplimiento de las metas producto establecidas, con lo cual se ubica en el rango “Sobresaliente” de calificación teniendo en cuenta los criterios definidos para calificar el avance del plan de acción anual. En relación con el componente de inversión, se alcanzó un logro del avance en la ejecución de los proyectos de un 73.11%, y un 64.27% en la ejecución presupuestal por compromisos a septiembre 2025.

Tabla 2. Resultados Generales PES-PR a 15.09.2025


Avance Plan de Acción Institucional corte 15 de septiembre	59,72%
Avance Plan de Desarrollo al Cuatrienio	33,68%
Ejecución Proyectos Plan de Emergencia Social	73,11%
Ejecución Presupuestal Según Compromisos al trimestre	64,27%
Ejecución Presupuestal Según Obligaciones al trimestre	22,73%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital

Esta dependencia no presenta una alineación en la ejecución estratégica y presupuestal, indicado en las siguientes diferencias:

- Entre la ejecución anual (59,72%) y la de proyectos (73,11%). Se están ejecutando actividades que no les impactan directamente a las metas producto.
- Entre la ejecución anual (59,72%) y el cuatrienio (33,68%), se evidencia el rezago de metas no cumplidas.
- Entre la ejecución de proyectos (73,11%) y la ejecución presupuestal según giros u obligaciones (22,73%), indicando que posiblemente queden recursos sin ejecutar y se deberán establecer vigencias futuras.

Ilustración 1. Avances Generales PES-PR 15.09.2025

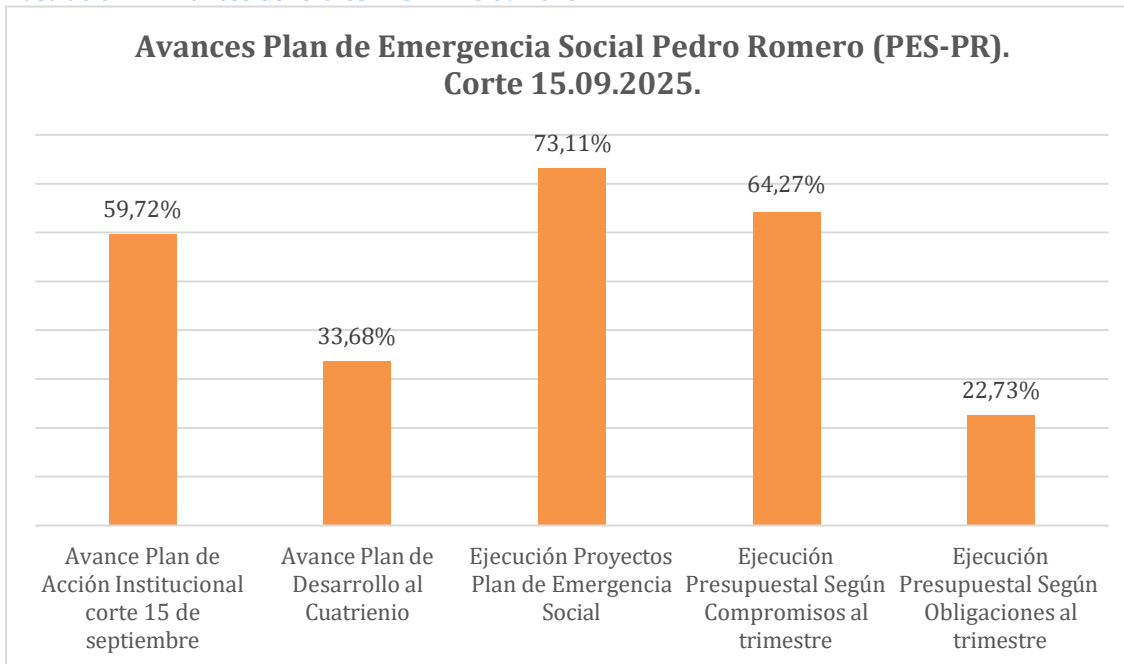

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital

2.2 Resultados comparativos junio- septiembre

De acuerdo con la tabla de información comparativa entre los resultados del trimestre de junio al de septiembre, el mayor crecimiento se presentó en la Ejecución Presupuestal por Compromisos con 39.66%, indicando con esto una aceleración de la gestión presupuestal seguido por la ejecución de los proyectos de inversión el cual tuvo un crecimiento del 26,99% justificando el aumento de la dinámica presupuestal con la de proyectos.

El menor crecimiento se dio en el Avance al Cuatrienio que solamente creció en un 7,50% indicando con esto el rezago de las metas no cumplidas en la vigencia 2024 y 2025.

Tabla 3. Resultados Comparativos Jun-Sept. 2025 PES-PR

Concepto	Avance junio	Avance septiembre	Crecimiento
Plan de Acción Institucional 2025	38,20%	59,72%	21,52%
Plan de Desarrollo al Cuatrienio	26,18%	33,68%	7,50%
Ejecución de Proyectos	46,12%	73,11%	26,99%
Ejecución Presupuestal por Compromisos	24,61%	64,27%	39,66%
Ejecución Presupuestal por Obligaciones	4,85%	22,73%	17,88%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital


En resumen, los resultados comparativos fueron los siguientes:

- Plan de acción Institucional 2025: Crecimiento del 21.52%, considerado un incremento positivo frente al periodo anterior, pasando de un 38.20% en junio a un 59.72% a septiembre.
- Plan de Desarrollo al cuatrienio: Crecimiento de un 7.50% nivel moderado con un avance bajo de un 38.68% a septiembre.
- Ejecución de proyectos: Crecimiento de un 26.99%. reflejando un avance moderado en la ejecución de los recursos, mostrando un 73.11% de avance en el mes de septiembre lo que evidencia un avance significativo en el cumplimiento de las metas establecidas.
- Ejecución Presupuestal por compromisos: Crecimiento de un 39.66% reflejando un mayor nivel de gestión y un avance favorable frente al periodo

- anterior del mes de junio con un 24.61% y alcanzando un 64.27% nivel representativo en la gestión del mes de septiembre.
- Ejecución Presupuestal por Obligaciones: Crecimiento de un 17.88% evidenciando un avance de un 22.73% frente al periodo anterior

En el siguiente gráfico se evidencia con mayor facilidad los crecimientos por concepto:

Ilustración 2. Crecimiento por Concepto del PES-PR a 15.09.2025.

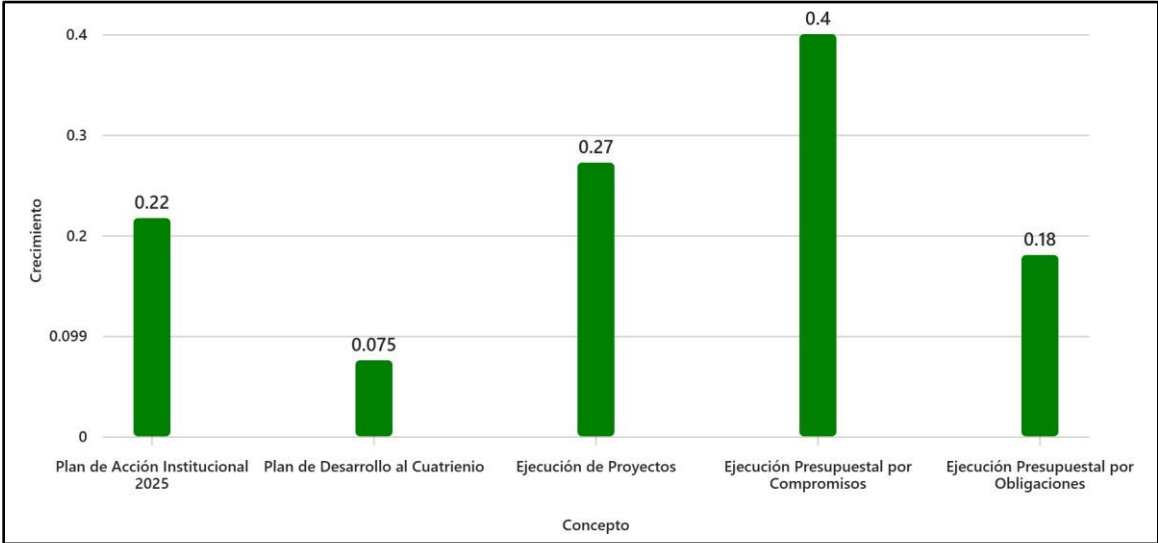

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital

2.3 Avance Programas

Programas	Avance Estratégico	Ejecución Presupuestal
-----------	--------------------	------------------------



	Año	Cuatrenio	Compromisos	Obligaciones
Identificación para la superación de la pobreza extrema	63,76%	28,95%	62,26%	35,87%
Salud para la superación de la pobreza extrema	92,23%	73,29%	57,37%	32%
Educación para la superación de la pobreza extrema	58,32%	30,62%	74,28%	39,77%
Habitabilidad para la superación de la pobreza extrema	21,00%	7,00%	3,84%	2,63%
Ingreso y trabajo para la superación de la pobreza extrema	35,68%	25,14%	0,96%	24%
Bancarización para la superación de la pobreza extrema	17,84%	6,31%	27,57%	56%
Dinámica familiar para la superación de la pobreza extrema	89,63%	51,81%	56,89%	27,76%
Seguridad alimentaria para la superación de la pobreza extrema	49,24%	32,85%	4,52%	2,55%
Acceso a la justicia para la superación de la pobreza extrema	100%	57,35%	50,20%	26,46%
Fortalecimiento institucional para la superación de la pobreza extrema	98,33%	45,69%	45,25%	13,77%
Mujer indígena, familia y generación de ingresos	30,67%	11,50%		

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital

A partir del cuadro anterior se evidencia un desempeño general favorable en términos de programas del Plan de Emergencia Social Pedro Romero, con avances equilibrados entre componente estratégico y presupuestal. Programas como Acceso a la Justicia para la superación de la pobreza extrema con un avance del 100%, Fortalecimiento Institucional para Superación de la Pobreza extrema con un 98.33% muestran niveles de cumplimiento del casi 100% en su avance estratégico para lo proyectado a 2025. Por otro lado, entre los programas con más bajos nivel de avance, se encuentra Bancarización para la Superación de la Pobreza Extrema con un 17.84% el cual se enfoca en buscar integrar a las personas de bajos ingresos al sistema financiero formal y con el objetivo de aumentar el servicio financiero en la población de pobreza extrema de Cartagena de Indias.

2.4 Análisis de Metas de Producto Estratégicas

Como parte de las iniciativas priorizadas por el alcalde y teniendo en cuenta los compromisos en su programa de gobierno y el impacto que generan en la ciudad, por

parte del Plan De Emergencia Social Pedro Romero ha priorizado las metas producto del Programa Seguridad Alimentaria y Nutrición para la superación de la pobreza extrema, con dos metas productos:

- Atender diez mil niños (10.000) en primera infancia, personas mayores y población con discapacidad con la estrategia de ollas comunitarias.
- Realizar noventa y seis (96) eventos de mercados campesinos.


Este programa cierra el corte de 15 septiembre con un avance acumulado del cuatrienio de 32.85% a la vigencia 2025 de 49.24%. Con estos resultados el programa se ubica en un nivel “bajo” respecto al cuatrienio según los criterios de evaluación definidos respecto a la vigencia 2025, indicando con esto, que se debe realizar un mayor esfuerzo por cumplir con lo estipulado en el Programa de Gobierno.

3. Avances de Proyectos y Ejecución Financiera

Con un avance promedio en ejecución de actividades de proyectos ubicado en un 73,11% considerado como Sobresaliente según la tabla de eficacia, esta dependencia tiene a su cargo 11 proyectos de inversión, que a la fecha de corte han ejecutado el presupuesto según compromisos o registros presupuestales un 64,27% y en obligaciones o giros un 22,73%, presentándose una brecha muy amplia entre ambos conceptos presupuestales, conllevando con esto la posibilidad de adelantar proceso de vigencias futuras para poder cumplir con lo contratado en esta vigencia.

3.1 Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión.

De los 11 proyectos a cargo del Plan de Emergencia Social, solamente 3 presentan una ejecución baja o deficiente a la fecha de corte, siendo estos los de: Educación (58,97%), Habitabilidad (20,73%) y por último el de Bancarización con un (57,89%) de ejecución. En consonancia con lo anterior, presentan también una baja ejecución presupuestal los proyectos de Habitabilidad y Bancarización, lo que de manera general ha afectado el cumplimiento del componente estratégico al año.

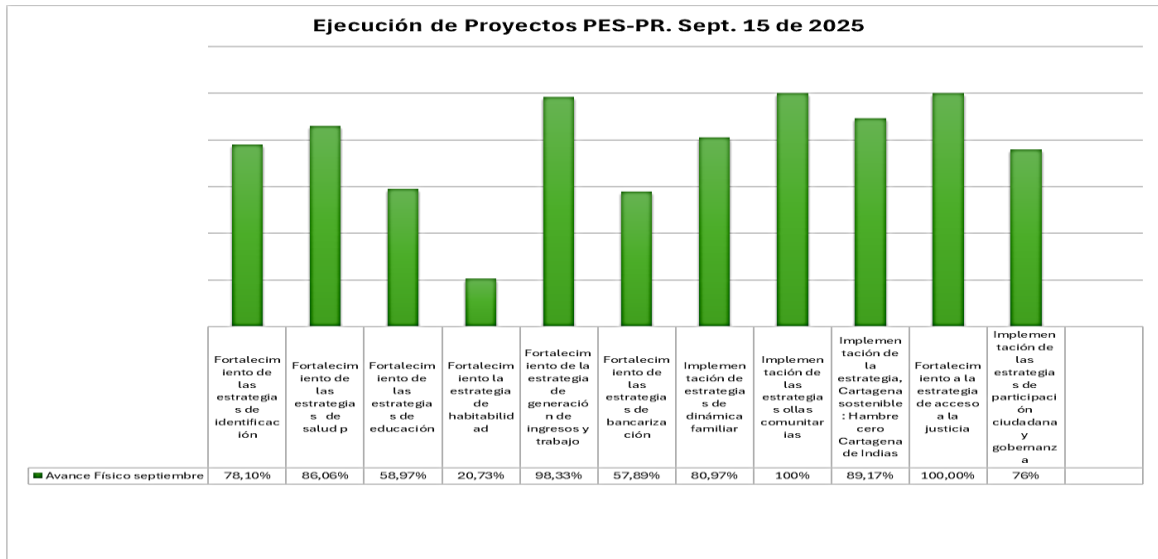

Adicionalmente:

- Dinámica familiar destaca con una ejecución muy alta tanto en compromisos (91.05%) como en obligaciones (89.80%), lo que indica una gestión eficiente.
- Educación y Identificación muestran buena ejecución por compromiso (74.58% y 65.20%), pero una caída significativa en obligaciones (36.29% y 35.87%), lo que sugiere retrasos en pagos.
- Habitabilidad, Bancarización, Ollas comunitarias y Cartagena sostenible tienen ejecución casi nula, lo que podría indicar problemas de implementación o falta de inicio.
- Generación de ingresos tiene una ejecución por compromiso baja (34.89%) y por obligaciones aún más baja (2.64%), lo que podría reflejar obstáculos administrativos o financieros.

Tabla 4. Resultados Proyectos y Presupuesto PES-PR 15.09.2025.

Proyecto	Apropiación Inicial	Apropiación Definitiva Septiembre	Avance Físico septiembre	Ejecución Ppto (Compromiso)	Ejecución Ppto (Obligación)
Fortalecimiento de las estrategias de identificación para la superación de la pobreza extrema y desigualdad de Cartagena de Indias	230.000.000	230.000.000	78,10%	63,26%	35,87%
Fortalecimiento de las estrategias de salud para la población en pobreza extrema en Cartagena de Indias	242.000.000	242.000.000	86,06%	57,37%	31,75%
Fortalecimiento de las estrategias de educación para la superación de la	175.684.800	175.684.800	58,97%	74,58%	39,77%




Proyecto	Apropiación Inicial	Apropiación Definitiva Septiembre	Avance Físico septiembre	Ejecución Ppto (Compromiso)	Ejecución Ppto (Obligación)
pobreza extrema de Cartagena					
Fortalecimiento la estrategia de habitabilidad para el mejoramiento de vivienda de las familias en situación de pobreza extrema de Cartagena	3.000.000.000	3.000.000.000	20,73%	3,84%	2,63%
Fortalecimiento de la estrategia de generación de ingresos y trabajo para la población en pobreza extrema del Distrito de Cartagena de Indias	3.600.000.000	3.200.000.000	98,33%	96,32%	24,24%
Fortalecimiento de las estrategias de bancarización para la población de pobreza extrema y desigualdad en Cartagena de Indias	307.000.000	96.800.000	57,89%	27,57%	55,74%
Implementación de estrategias de dinámica familiar como soporte social para la disminución de la pobreza en Cartagena de Indias	250.000.000	250.000.000	80,97%	56,89%	27,76%
Implementación de las estrategias ollas comunitarias para una estrategia sin hambre Cartagena de Indias	3.205.000.000	3.005.000.000	100%	91,59%	27,80%
Implementación de la estrategia, Cartagena sostenible: Hambre cero Cartagena de Indias	20.000.000	20.000.000	89,17%	0,00%	0,00%
Fortalecimiento a la estrategia de acceso a la justicia para la población en pobreza extrema y desigualdad del distrito de Cartagena	225.000.000	225.000.000	100,00%	50,20%	26,46%
Implementación de las estrategias de participación ciudadana y gobernanza en la población de pobreza extrema del Distrito de Cartagena	1.987.841.854	1.987.841.854	76%	64,64%	36,38%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital



Ejecución de Proyectos Física y Presupuestal PES-PR. 15.0G.2025

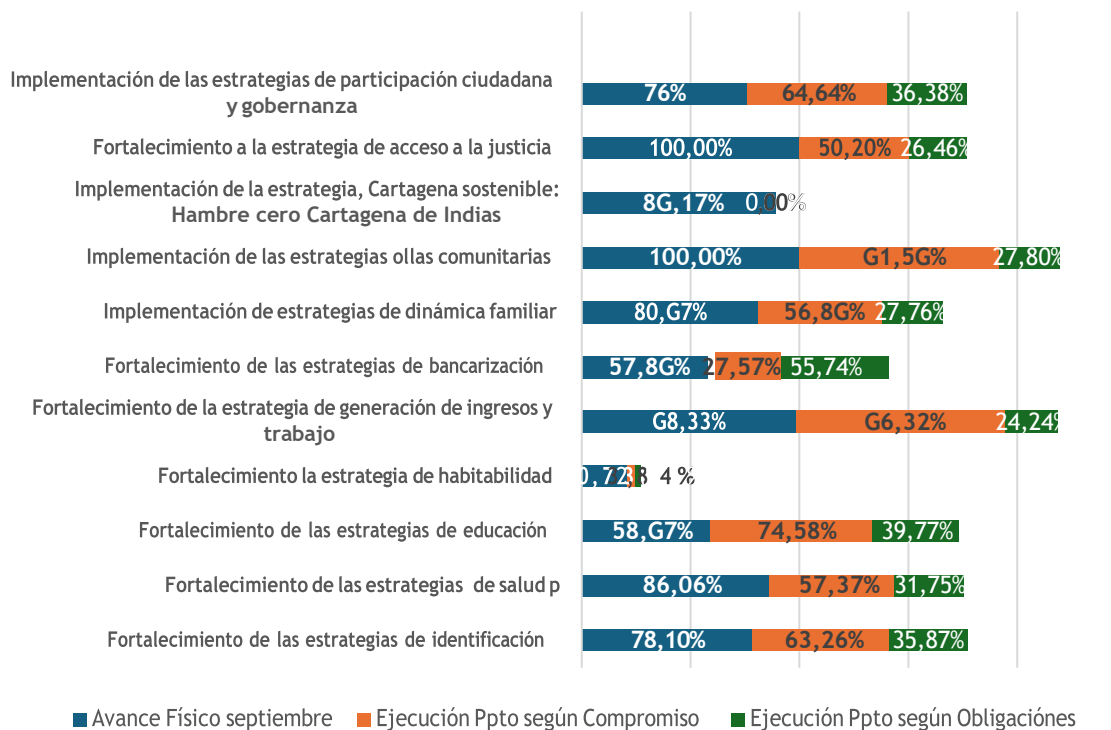

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital

3.2 Descripción de avance en los Proyectos de Inversión

A continuación, se detallan los proyectos de inversión ejecutados durante el trimestre, por parte del PES. Para cada proyecto se expone su articulación con los componentes estratégicos del Plan de Desarrollo Distrital, destacando cómo contribuye al logro de la meta producto asociada.

LÍNEA ESTRATÉGICA:
IMPULSOR DE AVANCE:
SOBERANIA ALIMENTARIA
PROGRAMA 1:
LA POBREZA EXTREMA

SEGURIDAD HUMANA
SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y
IDENTIFICACION PARA LA SUPERACION DE
BPIN 2024130010187- FORTALECIMIENTO
DE LAS ESTRATEGIAS DE IDENTIFICACION PARA LA SUPERACION DE LA
POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD DE CARTAGENA DE INDIAS

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 2025	78.10%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre	63.26%
Ejecución física/ financiera	35.87%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$ 230.000.000.00
Ejec. Financiera Según Obligaciones (mil de \$)	\$ 82.505.000.00
Metas producto asociadas	
Meta Producto 1	Garantizar el derecho a la identificación de dieciséis mil (16.000) personas
Cantidad planeada	5.500
Cantidad ejecutada	2614
Eficacia producto	47.53%
Meta Producto 2	Acompañar a dos mil doscientas (2.200) personas en la definición de su situación militar
Cantidad planeada	700
Cantidad ejecutada	560
Eficacia producto	80%

Con este proyecto se busca permitir que los jóvenes en población más vulnerables en pobreza extrema de los barrios y corregimientos de la ciudad puedan definir su situación militar bajo el marco de la estrategia gobierno al barrio e identificación para todos. Así mismo asesorar y definir la situación de libreta militar, bajo la estrategia Gobierno al Barrio e Identificación para todos.

Esta actividad se realizó con el fin de intervenir la situación militar de todos los hombres colombianos, a partir de los 18 hasta los 50 años de edad de la población objeto, el subprograma de Identificación del PES – PR en articulación con DISTRITO MILITAR 14, se orienta sobre la importancia de tener los documentos de acuerdo a la edad para así poder acceder a los servicios y programas sociales del estado, y de esta manera puedan mejorar su calidad de vida y alcanzar los mínimos vitales para el desarrollo humano integral.

LÍNEA ESTRATÉGICA: SEGURIDAD HUMANA
IMPULSOR DE AVANCE: SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y
SOBERANIA ALIMENTARIA
PROGRAMA 2: SALUD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
EXTREMA
PROYECTO: BPIN 2024130010177 FORTALECIMIENTO DE
LAS ESTRATEGIAS DE LA SALUD PARA LA POBLACION EN POBREZA EXTREMA
EN CARTAGENA DE INDIAS

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 2025	86.06 %
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre	57.37%
Ejecución física/ financiera	32.00%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$242.000.000.00
Ejec. Financiera Según Obligaciones (mil de \$)	\$76.845.000.00
Metas producto asociadas	
Meta Producto 1	Coordinar la afiliación para cinco mil (5.000) personas en pobreza extrema, víctimas del conflicto armado, migrantes y retornados al Sistema General de Seguridad Social
Cantidad planeada	1334
Cantidad ejecutada	1023
Eficacia producto	76.69%
Meta Producto 2	Formar doce mil (12.000) nuevas personas en pobreza extrema en asuntos de salud integral
Cantidad planeada	2400
Cantidad ejecutada	2735
Eficacia producto	100%
Meta Producto 3	Elaborar una (1) caracterización de los Consejos Comunitarios y Cabildo para el

	fortalecimiento de la práctica de medicina ancestral
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	1
Eficacia producto	100%

Con este proyecto se busca llevar la oferta institucional de servicios del distrito y de aliados privados en articulación con dadis mediante los programas de salud mental, salud sexual y reproductiva, salud infantil, nutrición, tb y lepra, infancia, etv, zoonosis, aseguramiento- ese hospital local Cartagena de indias. apuntando al acompañamiento de las familias y mejoría de su calidad de vida a través de la promoción y prevención.

Se ofrecen jornadas de atención y formación en asuntos de salud integral dirigida a las familias y comunidad en general con el fin de intervenir en las necesidades de la población objeto y así, realizar acompañamiento a las familias en pro de mejorar su calidad de vida, llevando atenciones de manera específica y su inclusión en programas sociales del estado en articulación con la dirección operativa de salud pública del dadis a través de sus gestores pic y los programas promoción social, infancia, enfermedades crónicas no transmisibles, tbc y lepra, zoonosis, etv, y aseguramiento, ese hospital local de indias – Profamilia – fami salud ips - Cartagena de indias, entre otras. la población se benefició población con los siguientes servicios:

- personas sensibilizadas en dengue y fiebre
- personas sensibilizadas en ira eda
- personas sensibilizadas en cáncer infantil, prevención de la hipertensión, diabetes y
- lactancia materna y hábitos de vida saludables.
- dosis de vacunas aplicadas a adultos y niños.
- dosis de vacunas aplicadas a caninos y felinos.
- pruebas rápidas de vih
- atenciones por medicina general
- personas sensibilizadas para tbc y lepra.

LÍNEA ESTRATÉGICA:

SEGURIDAD HUMANA

IMPULSOR DE AVANCE:

SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y

SOBERANIA ALIMENTARIA

PROGRAMA 3:

EDUCACION PARA LA SUPERACION DE LA

POBREZA

PROYECTO:

BPIN2024130010188 FORTALECIMIENTO DE

LA ESTRATEGIA DE EDUCACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA DE CARTAGENA



Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 2025	58.97%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre	74.58%
Ejecución física/ financiera	39.77%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$175.684.800
Ejec. Financiera Según Obligaciones (mil de \$)	\$69.875.000.00
Metas producto asociadas	
Meta Producto 1	Vincular cinco mil quinientos cincuenta y seis (5.556) niños, niñas y adolescentes en pobreza extrema al sistema educativo en articulación con la Secretaría de Educación Distrital
Cantidad planeada	1500
Cantidad ejecutada	493
Eficacia producto	32.87%
Meta Producto 2	Vincular catorce mil (14.000) jóvenes y adultos en pobreza extrema en programas de acceso a educación técnica.
Cantidad planeada	5000
Cantidad ejecutada	2869
Eficacia producto	57.38%
Meta Producto 3	Formar a veinticinco mil familias (25.000) sobre el valor de la educación
Cantidad planeada	8000
Cantidad ejecutada	3442
Eficacia producto	43.03%
Meta Producto 4	Implementar programas de retención escolar en cincuenta (50) Instituciones Educativas Oficiales
Cantidad planeada	15
Cantidad ejecutada	18
Eficacia producto	100%

Con este proyecto se busca generar conciencia en los estudiantes sobre la importancia de la educación como herramienta de transformación personal y social, reconociendo su papel en la construcción del proyecto de vida y en el desarrollo de la comunidad.

Durante estas secciones se desarrollan charlas dinámicas y motivacional basada en reflexiones, datos reales y materiales visuales. Los contenidos abordados incluyen:

- El papel de la educación como derecho fundamental y pilar de la equidad social.
- La relación directa entre el nivel educativo y el acceso a mejores oportunidades laborales.
- La formación académica como medio para desarrollar pensamiento crítico, ciudadanía responsable y valores humanos.
- Se incentivó a los estudiantes a comprender que la educación transforma no solo su vida, sino también la de sus familias y comunidades.
- Estrategias inspiradoras para la orientación de un proyecto de vida En esta parte del taller, se comparten herramientas prácticas para que los jóvenes comiencen a visualizar su proyecto de vida con claridad.

LINEA ESTRATEGICA:

SEGURIDAD HUMANA

IMPULSOR DE AVANCE:

SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y

SOBERANIA ALIMENTARIA

PROGRAMA 4:

HABITABILIDAD PARA LA SUPERACION DE LA

POBREZA EXTREMA

PROYECTO:

BPIN 2024130010185 FORTALECIMIENTO LA

ESTRATEGIA DE HABITABILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE

LAS FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA DE CARTAGENA

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 2025	20.73%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre	3.84%
Ejecución física/ financiera	2.63%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$3.000.000.000.00
Ejec. Financiera Según Obligaciones (mil de \$)	\$79.000.000.00
Metas producto asociadas	

Meta Producto 1	Mejorar cinco mil (5.000) unidades de vivienda en sectores en pobreza extrema del Distrito de Cartagena
Cantidad planeada	1650
Cantidad ejecutada	350
Eficacia producto	21.21%

Este proyecto sintetiza la labor institucional del equipo de Habitabilidad del Plan de Emergencia Social Pedro Romero, PES-PR, durante las jornadas de Gobierno al Barrio con el objetivo de vincular a esta comunidad y a las familias que viven en condición de extrema pobreza del distrito de Cartagena a la oferta de servicios institucionales PES-PR.

El objetivo del recorrido es identificar los predios que requieren de atención de saneamiento básico, observando el estado de las viviendas, en especial en espacios como:

- Pisos.
- Baños.
- Cocina

Al mismo tiempo verificar como se encuentra el ambiente externo como:

- Limpieza de las Calles.
- Áreas Verdes
- Zonas Comunes.
- Índices de Seguridad.
- Niveles de Ruido.
- Contaminación.
- Cobertura de Servicios Públicos.

Requisitos Para Aplicar a Proyecto de Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad (MCH-PES-PR)

1. Pertenecer al nivel A1 a A5 del Sisbén.
2. Carecer de baño, cocina y plantilla de pisos con materiales adecuados, o tenerlos en precarias condiciones físicas y de funcionamiento.
3. Tener escritura o minuta de posesión de la vivienda.
4. Tener conexión al sistema de alcantarillado en la vivienda.
5. No poseer problemas de tipo estructural o de cerramiento en la vivienda (Vigas o muros agrietados)
6. No encontrarse en áreas declaradas como de riesgo por la OAGRD.

Nota: Se debe identificar dentro de la comunidad a las familias que cumplan estos requisitos

para participar en los proyectos MCH-PES-PR.

LINEA ESTRATEGICA: SEGURIDAD HUMANA
IMPULSOR DE AVANCE: SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y
SOBERANIA ALIMENTARIA
PROGRAMA 5: INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACION
DE LA POBREZA EXTREMA
PROYECTO: BPIN 2024130010198 FORTALECIMIENTO DE
LA ESTRATEGIA DE GENERACION DE INGRESOS Y TRABAJO PARA LA
POBLACION EN POBREZA EXTREMA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 2025	98.33%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre	96%
Ejecución física/ financiera	24%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$3.600.000.000.00
Ejec. Financiera Según Obligaciones (mil de \$)	\$ 775.575.000.00
Metas producto asociadas	
Meta Producto 1	Dotar con capital de trabajo y formación empresarial a ocho mil (8.000) familias en pobreza extrema
Cantidad planeada	2550
Cantidad ejecutada	1545
Eficacia producto	60.59%
Meta Producto 2	Apoyar técnica y financieramente a tres mil ochocientos (3.800) emprendimientos y/o unidades productivas
Cantidad planeada	1170
Cantidad ejecutada	406
Eficacia producto	34.70%
Meta Producto 3	Impactar a ochenta (80) organizaciones de economía popular integradas por población de pobreza extrema en economía solidaria

Cantidad planeada	20
Cantidad ejecutada	10
Eficacia producto	50%
Meta Producto 4	Crear un (1) Centro de Oportunidades para el Empleo del Distrito de Cartagena
Cantidad planeada	0.33
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%
Meta Producto 5	Gestionar la vinculación de empleo formal para tres mil doscientas (3.200) personas en pobreza extrema
Cantidad planeada	1000
Cantidad ejecutada	331
Eficacia producto	33.10%

Este proyecto busca integrar capacidades técnicas, profesionales, administrativas y financieras para fortalecer unidades productivas de familias en situación de pobreza extrema en Cartagena. Es liderado por el Plan de Emergencia Social Pedro Romero y la Unidad de Desarrollo Económico de la Secretaría de Hacienda, como parte del compromiso institucional con el desarrollo económico local.

Durante la fase de diagnóstico y caracterización, se identificó una población vulnerable en las tres localidades del Distrito, conformada principalmente por mujeres cabeza de hogar, migrantes venezolanos y grupos históricamente excluidos. El proceso incluyó visitas de campo, entrevistas y análisis sociodemográfico con enfoque interseccional y de género, lo que permitió priorizar a personas con alto potencial emprendedor. Se estableció una línea base para el seguimiento, planificación logística y asignación del capital semilla. Como resultado, se seleccionaron 208 beneficiarios con representación territorial y social, de los cuales más del 60 % fueron mujeres, validado por el equipo técnico y líderes comunitarios.

LINEA ESTRATEGICA: SEGURIDAD HUMANA
IMPULSOR DE AVANCE: SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y
SOBERANIA ALIMENTARIA
PROGRAMA 6: BANCARIZACION PARA LA SUPERACION DE LA
POBREZA EXTREMA
PROYECTO: BPIN 2024130010184 FORTALECIMIENTO DE
LA ESTRATEGIA DE BANCARIZACION PARA LA POBLACION DE POBREZA
EXTREMA Y DESIGUALDAD EN CARTAGENA DE INDIAS

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 2025	57.89%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre	27.57%
Ejecución física/ financiera	56.00%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$ 307.000.000.00
Ejec. Financiera Según Obligaciones (mil de \$)	\$ 53.960.000.00
Metas producto asociadas	
Meta Producto 1	Vincular veinte mil (20.000) Personas en pobreza extrema vinculadas al sistema financiero.
Cantidad planeada	6000
Cantidad ejecutada	947
Eficacia producto	15.78%
Meta Producto 2	Lograr acceso a crédito financiero para tres mil (3.000) familias en pobreza extrema
Cantidad planeada	1000
Cantidad ejecutada	199
Eficacia producto	19.90%

El objetivo de este proyecto es promover el acceso a servicios financieros formales, para personas en situación de pobreza extrema, facilitando su inclusión económica y social. Las jornadas tienen como propósito principal facilitar el acceso a servicios financieros formales a los asistentes del evento “Gobierno al Barrio”, promoviendo la inclusión económica y el fortalecimiento de capacidades financieras en la comunidad las cuales se desarrollan así:

1. Organización Logística:

Las actividades se organizan en articulación con líderes comunitarios y el aliado Opportunity Grupo de Ahorros, quienes definieron el espacio de intervención dentro del evento y coordinaron la ubicación del stand informativo, garantizando la visibilidad y el flujo de participantes interesados.

2. Proceso de Bancarización:

Funcionarios del Grupo de Ahorros y Opportunity brindan información sobre la metodología de ahorro solidario, resolvieron dudas y realizaron el proceso de inscripción para los nuevos usuarios.

3. Promoción de la Inclusión Financiera:

Durante el desarrollo de las jornadas, se promueve activamente la importancia de la bancarización y del ahorro como herramientas clave para la inclusión social y económica. Se resalta el impacto positivo de estas prácticas en la formalización financiera de las familias y su contribución al fortalecimiento de emprendimientos comunitarios y actividades económicas locales

LINEA ESTRATEGICA: **SEGURIDAD HUMANA**

IMPULSOR DE AVANCE: **SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y**
SOBERANIA ALIMENTARIA

PROGRAMA 7: **DINAMICA FAMILIAR PARA LA SUPERACION DE**
LA POBREZA EXTREMA

PROYECTO: **BPIN2024130010182 IMPLEMENTACION DE**
ESTRATEGIAS DINAMICA FAMILIAR COMO SOPORTE SOCIAL PARA LA
DISMINUCION DE LA POBREZA EN CARTAGENA DE INDIAS

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 2025	80.97%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre	56.89%
Ejecución física/ financiera	
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$ 250.000.000.00
Ejec. Financiera Según Obligaciones (mil de \$)	\$ 69.400.000.00
Metas producto asociadas	
Meta Producto 1	Formar mil noventa y dos (1.092) nuevos miembros de familias en el



	Distrito de Cartagena en prevención al consumo de sustancias psicoactivas
Cantidad planeada	346
Cantidad ejecutada	541
Eficacia producto	100%
Meta Producto 2	Implementar cuatro (4) estrategias de prevención de violencia basada en género y violencia intrafamiliar para familias en pobreza extrema
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	1
Eficacia producto	100%
Meta Producto 3	Coordinar y elaborar ciento cincuenta (150) talleres lúdicos recreativos para generar códigos de convivencia con organizaciones de base comunitaria
Cantidad planeada	45
Cantidad ejecutada	31
Eficacia producto	68.89%

Este proyecto busca identificar prevenir el consumo de sustancias psicoactivas y conocer los problemas de salud derivados del consumo de estas, así como desarrollar capacidades y habilidades que les permitan resistir la presión grupal y social en los jóvenes

Promover a través de talleres Lúdico-Pedagógicas llamada “Generación Sana entornos seguros” la concientización de los riesgos y consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas, poniendo en práctica la prevención efectiva, fortaleciendo el apoyo familiar y comunitario para reducir la vulnerabilidad a la adicción.

Se brindan talleres sobre la importancia de la prevención del consumo de sustancias en y el rol de cada uno en la construcción de un entorno seguro. Durante las actividades, se empleen diferentes dinámicas lúdicas y juegos interactivos a cargo de que permiten a los estudiantes reflexionar sobre situaciones cotidianas relacionadas con el consumo de estas sustancias.

Actividades:

- **Dinámica de sensibilización:** Los estudiantes participan en una actividad grupal donde, a través de situaciones hipotéticas, discutieron sobre las

consecuencias del consumo de sustancias y cómo podrían enfrentarse a estas situaciones de manera responsable

- **Debate y reflexión grupal:** Al finalizar las dinámicas, los estudiantes discuten en grupo sobre las conclusiones de las actividades, destacando la importancia de la amistad, la confianza y el autocuidado como herramientas clave para evitar caer en el consumo de sustancias.

FACTORES DE RIESGO: son situaciones, personas o entornos que aumentan la probabilidad de que una persona consuma sustancias psicoactivas.

Factores relacionados con características individuales: personalidad (autoestima, asertividad, norma, búsqueda sensaciones, tolerancia a la frustración, manejo estrés

LINEA ESTRATEGICA: **SEGURIDAD HUMANA**

IMPULSOR DE AVANCE: **SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y SOBERANIA ALIMENTARIA**

PROGRAMA 8: **SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA**

PROYECTO: **BPIN 2024130010196 IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS OLLAS COMUNITARIAS PARA UNA ESTRATEGIA SIN HAMBRE CARTAGENA DE INDIAS**

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 2025	100%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre	91.59%
Ejecución física/ financiera	27.80%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$3.005.000.000.00
Ejec. Financiera Según Obligaciones (mil de \$)	\$835.368.000.00
Metas producto asociadas	
Meta Producto 1	Atender diez mil (10.000) niños en primera infancia, personas mayores y población con discapacidad con la estrategia de ollas comunitarias

Cantidad planeada	2342
Cantidad ejecutada	2700
Eficacia producto	100%
Meta Producto 2	Atender a cincuenta y un mil (51.000) personas con la estrategia Hambre Cero
Cantidad planeada	22000
Cantidad ejecutada	2800
Eficacia producto	12.73%
Meta Producto 3	Realizar noventa y seis (96) eventos de Mercados campesinos
Cantidad planeada	40
Cantidad ejecutada	14
Eficacia producto	35%

Con este proyecto se busca Disminuir los Índices de desnutrición de la población en pobreza extrema Fortalecer la seguridad alimentaria mediante la implementación de Mercados Campesinos.

Promover y ejecutar los mercados campesinos en las tres localidades de Cartagena. Implementar acciones de educación y sensibilización sobre hábitos nutricionales, compra y consumo responsable de alimentos. Implementar las buenas prácticas para la recolección, rescate, donación y distribución de alimentos aptos para el consumo entre los actores del abastecimiento y los beneficiarios. Desarrollar campañas de sensibilización para los actores de abastecimiento sobre la importancia de la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos y practicas sostenibles. Logística y tecnología requerida para la recolección, acopio, adecuación y distribución de los alimentos rescatados.

LÍNEA ESTRATÉGICA:

SEGURIDAD HUMANA

IMPULSOR DE AVANCE:

SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y

SOBERANIA ALIMENTARIA

PROGRAMA 9:

ACCESO A LA JUSTICIA PARA LA SUPERACION DE

LA POBREZA EXTREMA

PROYECTO:

BPIN2024130010183 FORTALECIMIENTO A LA

ESTRATEGIA DE ACCESO A LA JUSTICIA PARA LA POBLACION EN POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD DEL DISTRITO DE CARTAGENA

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 2025	100%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre	50.20%

Ejecución física/ financiera	26.46%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$225.000.000.00
Ejec. Financiera Según Obligaciones (mil de \$)	\$59.535.000.00
Metas producto asociadas	
Meta Producto 1	Crear diecisiete (17) rutas de atención que permitan la atención oportuna para garantizar derechos y resolver conflictos
Cantidad planeada	6
Cantidad ejecutada	7
Eficacia producto	100%
Meta Producto 2	Implementar cuatro (4) estrategias de comunicación para dar a conocer las rutas del Plan de Emergencia Social

LÍNEA ESTRATÉGICA : **SEGURIDAD HUMANA**
PROGRAMA 10: **FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA**
ROYECTO: **BPIN2024130010192 IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y GOBERNANZA EN LA POBLACION DE POBREZA EXTREMA DE DISTRITO DE CARTAGENA**

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 2025	76.39%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre	0.00%
Ejecución física/ financiera	36%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$1.987.841.854.00
Ejec. Financiera Según Obligaciones (mil de \$)	\$ 723.192.786.00
Metas producto asociadas	
Meta Producto 1	Desarrollar ciento veinte (120) jornadas de atención integral a la comunidad "Gobierno al Barrio".
Cantidad planeada	30

Cantidad ejecutada	29
Eficacia producto	96.67%
Meta Producto 2	Desarrollar setenta y dos (72) jornadas de diálogos y gobernanza en el Distrito de Cartagena a través de la estrategia “Encuentros Barriales”
Cantidad planeada	16
Cantidad ejecutada	17
Eficacia producto	100%

El Plan de Emergencia Social Pedro Romero (PES –PR) por medio del subprograma FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, estableció para este periodo de gobierno por medio del plan de desarrollo “Cartagena Ciudad de Derechos” 2024-2027, los denominados “Encuentros Barriales” o “concejos de gobierno/seguridad” como estrategia que permite a los cartageneros el dialogo con el gobierno Distrital de Cartagena, manifestando las inquietudes e inconformidades de sus territorios, permitiendo así obtener unas posibles soluciones para la comunidad. De estos encuentros se generan una serie de compromisos establecidos por medio del alcalde Dumek Turbay y su gabinete distrital, comprometiendo fecha, actividad y solución pronta a la problemática.

LÍNEA ESTRATÉGICA: DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDAD ÉTNICA
IMPULSOR DE AVANCE:
PROGRAMA: MUJER INDÍGENA, FAMILIA Y GENERACION
DE INGRESOS
PROYECTO: BPIN 2024130010198 FORTALECIMIENTO
 DE LA ESTRATEGIA DE GENERACION DE INGRESOS Y TRABAJO PARA LA
 POBLACION EN POBREZA EXTREMA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 2025	30.67%
Metas producto asociadas	
Meta Producto 1	Brindar asistencia técnica y apoyo financiero a doscientas (200) unidades productivas de los Cabildos Indígenas presentes en el Distrito
Cantidad planeada	75
Cantidad ejecutada	23



Eficacia producto	30.67%
-------------------	--------

3.2 Ejecución Presupuestal Global PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO

PRESUPUESTO PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO PES-PR 2025	
Apropiación Inicial	\$13.242.526.654
Apropiación Vigente	\$12.432.326.654
Ejecución por Compromisos	\$7.989.942.886
% de Ejecución Compromisos	64,25%
Ejecución por Obligaciones	\$2.825.255.786
% de Ejecución Obligaciones	22,73%

4. Conclusiones y Recomendaciones

De los 10 programas a cargo del Plan de Emergencia Social, 4 presentan una ejecución eficiente y sobresaliente, siendo estos: Acceso a la Justicia, Fortalecimiento Institucional, Dinámica Familiar y Salud. Con preocupación se denota que 3 programas presentan rezagos importantes siendo que son los más estructurantes en la estrategia de superación de la pobreza extrema, estos son los programas de: Habitabilidad, Ingreso y Trabajo y Bancarización.

En cuanto a la ejecución presupuestal la mayoría de los proyectos muestran buena gestión por compromisos, aunque algunos como Habitabilidad y Cartagena Sostenible de la estrategia para la Nutrición requieren que se ejecuten tanto física como presupuestalmente. De igual manera también se presenta la situación de que existe y persiste una brecha entre compromisos y obligaciones indicando con esto que los recursos comprometidos aún no han sido girados, lo que podría generar acumulación de saldos no ejecutados o proceso de vigencias futuras.

Se puede resumir la ejecución de esta dependencia en tres aspectos:



- Desfase estratégico-presupuestal: Algunos programas tienen alta ejecución presupuestal, pero bajo impacto estratégico (ej. Bancarización).
- Riesgo de rezago cuatrienal: El avance al cuatrienio (33.68%) es significativamente menor que el avance anual (59.72%), lo que indica metas acumuladas no cumplidas.
- Necesidad de vigencias futuras: La baja ejecución por obligaciones frente a compromisos sugiere que se requerirá trasladar recursos a vigencias futuras para cumplir con lo contratado.
