

Informe de Seguimiento Trimestral al Plan de Acción Institucional- Departamento Administrativo Distrital de Salud DADIS

Plan de Desarrollo Distrital 2024–2027: Cartagena Ciudad de Derechos

Periodo evaluado: Tercer Trimestre de 2025 (15 de septiembre)

Fecha de presentación: 25/10/2025

Elaborado por: Yamil Gómez Rocha- Secretaría de Planeación

Índice

Contenido

Índice	2
1. Introducción.....	3
2. Avances Consolidados en Programas y Metas de Producto	3
2.1 Panorama General.....	3
2.2 Resultados comparativos junio- septiembre. Corte 15 de septiembre de 2025.	4
2.3 Avance Programas	6
2.4 Análisis de Metas de Producto Estratégicas.....	7
3. Avances de Proyectos y Ejecución Financiera	9
3.1 Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión.....	9
3.2 Ejecución Presupuestal.....	35
4. Conclusiones y Recomendaciones	36

1. Introducción

Este informe se enmarca en lo establecido por la Ley 152 de 1994, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, que establece la obligación de los entes territoriales y sus autoridades de formular y ejecutar un plan de desarrollo, así como realizar un seguimiento y evaluación periódica del mismo. El seguimiento y la evaluación son ejercicios fundamentales que permiten informar a todos los actores del territorio sobre los avances en las líneas estratégicas, los componentes impulsores de avance, los programas y las metas, con el fin de determinar el nivel de cumplimiento alcanzado en cada uno de los años del periodo de gobierno.

2. Avances Consolidados en Programas y Metas de Producto

2.1 Panorama General

Con corte al 15 de septiembre de 2025, los resultados del Plan de Acción Institucional del Departamento Administrativo Distrital de Salud DADIS, se observa que se alcanzó un 51,20%, frente a un 75% esperado. Esta diferencia de casi 24 puntos porcentuales muestra una ejecución por debajo de lo proyectado, lo que indica que aún existen atrasos en la implementación de algunas acciones programadas para este periodo.

El avance acumulado del Plan de Desarrollo en lo que va del cuatrienio también presenta una leve brecha frente a la meta trazada. Se registra un cumplimiento del 43%, frente a un objetivo del 44,59%, lo que representa una diferencia de aproximadamente 1,6 puntos porcentuales. Aunque la brecha se ha reducido en comparación con periodos anteriores, sigue siendo necesario fortalecer los mecanismos de seguimiento y control para asegurar el cumplimiento pleno de los objetivos institucionales hacia el cierre del cuatrienio.

En lo que respecta a la ejecución de proyectos específicos a cargo de la dependencia, el resultado alcanzado fue del 54,90%, frente a una meta del 75%. Esta diferencia evidencia que persisten desafíos operativos y administrativos que pueden estar afectando el ritmo de ejecución. Factores como demoras contractuales, limitaciones logísticas o dificultades en la articulación interinstitucional podrían estar incidiendo en este comportamiento, por lo que se recomienda profundizar en las estrategias de gestión y optimización de procesos.


En términos financieros, la ejecución presupuestal basada en compromisos adquiridos alcanzó un 87,0%, superando la tendencia de trimestres anteriores y acercándose al nivel esperado. Este avance representa un esfuerzo importante de la entidad para garantizar el uso eficiente de los recursos disponibles. No obstante, es necesario mantener la vigilancia sobre la materialización de estos compromisos en acciones concretas que generen impacto positivo en los territorios y comunidades beneficiadas.

Por otro lado, el indicador de ejecución presupuestal basado en obligaciones presenta una mejora significativa frente al corte anterior, con un cumplimiento del 56,7% frente al 75% esperado. Aunque aún existe una diferencia de aproximadamente 18 puntos porcentuales, el incremento respecto a periodos previos evidencia una tendencia positiva en la capacidad

institucional para transformar compromisos en obligaciones reales —es decir, en pagos y ejecución efectiva de recursos


Avance Plan de Desarrollo a (trimestre)	51,2%
Avance Plan de Desarrollo al Cuatrienio	43%
Ejecución Proyectos (dependencia)	54,9%
Ejecución Presupuestal Según Compromisos a (trimestre)	87,0%
Ejecución Presupuestal Según Obligaciones a (trimestre)	56,7%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

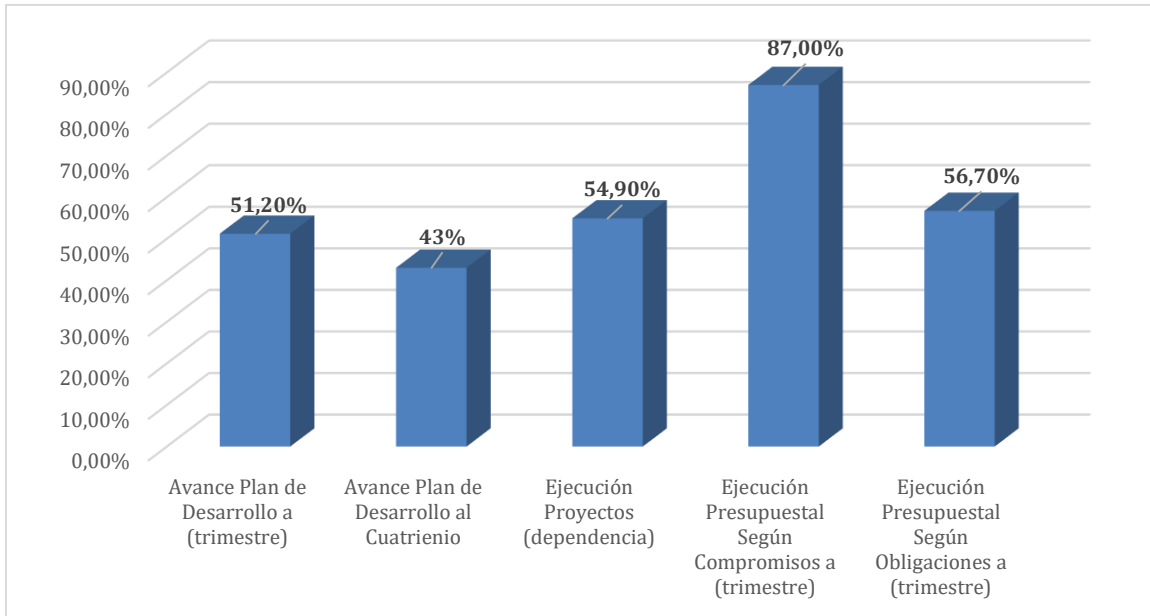

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

2.2 Resultados comparativos junio- septiembre. Corte 15 de septiembre de 2025.

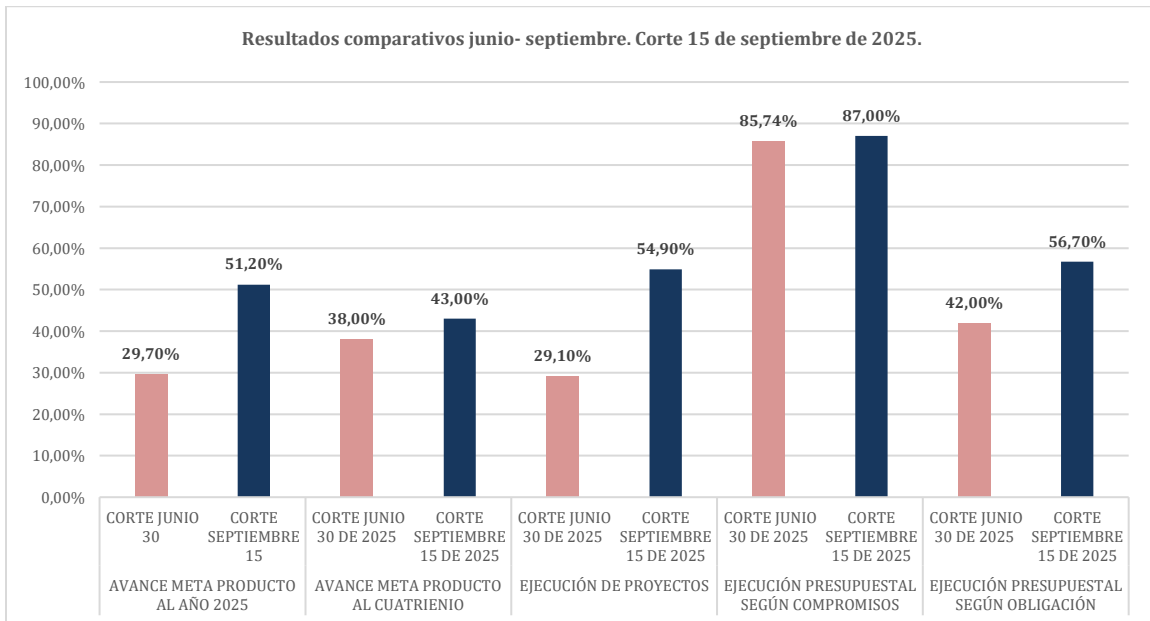

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025



El seguimiento al Plan de Acción Institucional del Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), con corte al 30 de junio y al 15 de septiembre de 2025, permite evidenciar un comportamiento diferenciado entre los indicadores de avance de metas y de ejecución presupuestal.

En primer lugar, el avance de las metas de producto al año 2025 muestra un progreso significativo: mientras que a junio se alcanzaba un 29,7% de cumplimiento, para septiembre este valor se incrementó a 51,2%. Este aumento de más de veinte puntos porcentuales evidencia que durante el tercer trimestre del año se intensificaron las acciones programadas, reflejando un esfuerzo institucional por cumplir las metas trazadas para la vigencia en curso.

De manera complementaria, al observar el avance de las metas de producto al cuatrienio, se evidencia un incremento más moderado, pasando de 38,0% en junio a 43,0% en septiembre. Aunque este crecimiento representa un avance sostenido, es inferior al observado en las metas anuales, lo cual sugiere que los esfuerzos se han enfocado principalmente en el cumplimiento de los objetivos de corto plazo. Esto podría estar relacionado con la priorización de acciones inmediatas para asegurar el cierre exitoso de la vigencia anual, dejando algunos objetivos estratégicos de largo alcance en una etapa de desarrollo más incipiente.


Esta diferencia entre el avance anual y cuatrienal se convierte en un elemento clave de análisis. Mientras las metas de corto plazo muestran un avance significativo, las metas estratégicas a cuatro años no superan el 45% de cumplimiento, lo que plantea el reto de acelerar la ejecución en los próximos trimestres para garantizar el cumplimiento integral del Plan de Desarrollo. Este comportamiento resalta la importancia de fortalecer la planificación articulada entre las dependencias del DADIS, de modo que el cumplimiento de metas estratégicas no se concentre únicamente al final del periodo de gobierno.

Por otra parte, al analizar la ejecución de proyectos, se observa una evolución positiva, pasando de 29,1% en junio a 54,9% en septiembre. Este incremento de más de 25 puntos porcentuales evidencia avances importantes en la implementación operativa de las iniciativas previstas. Sin embargo, dado que la ejecución apenas supera la mitad del total programado, será necesario reforzar la gestión y la coordinación técnica y administrativa para lograr un cumplimiento más equilibrado al cierre del año.

Asimismo, la ejecución presupuestal según compromisos muestra un comportamiento sólido, con un avance de 85,74% en junio y de 87,0% en septiembre. Este indicador refleja que gran parte de los recursos ya se encuentran comprometidos, lo que es positivo en términos de planeación financiera, ya que demuestra que el DADIS ha asegurado los recursos necesarios para el desarrollo de sus proyectos y actividades.

No obstante, al contrastar esta información con la ejecución presupuestal según obligaciones, se observa una brecha relevante: a junio este indicador alcanzaba 42,0%, y para septiembre ascendió a 56,7%. Aunque el crecimiento es importante, aún se mantiene por debajo del nivel de compromisos, lo que evidencia que, si bien los recursos están comprometidos, su ejecución efectiva mediante pagos u obligaciones financieras avanza a un ritmo más lento.

2.3 Avance Programas

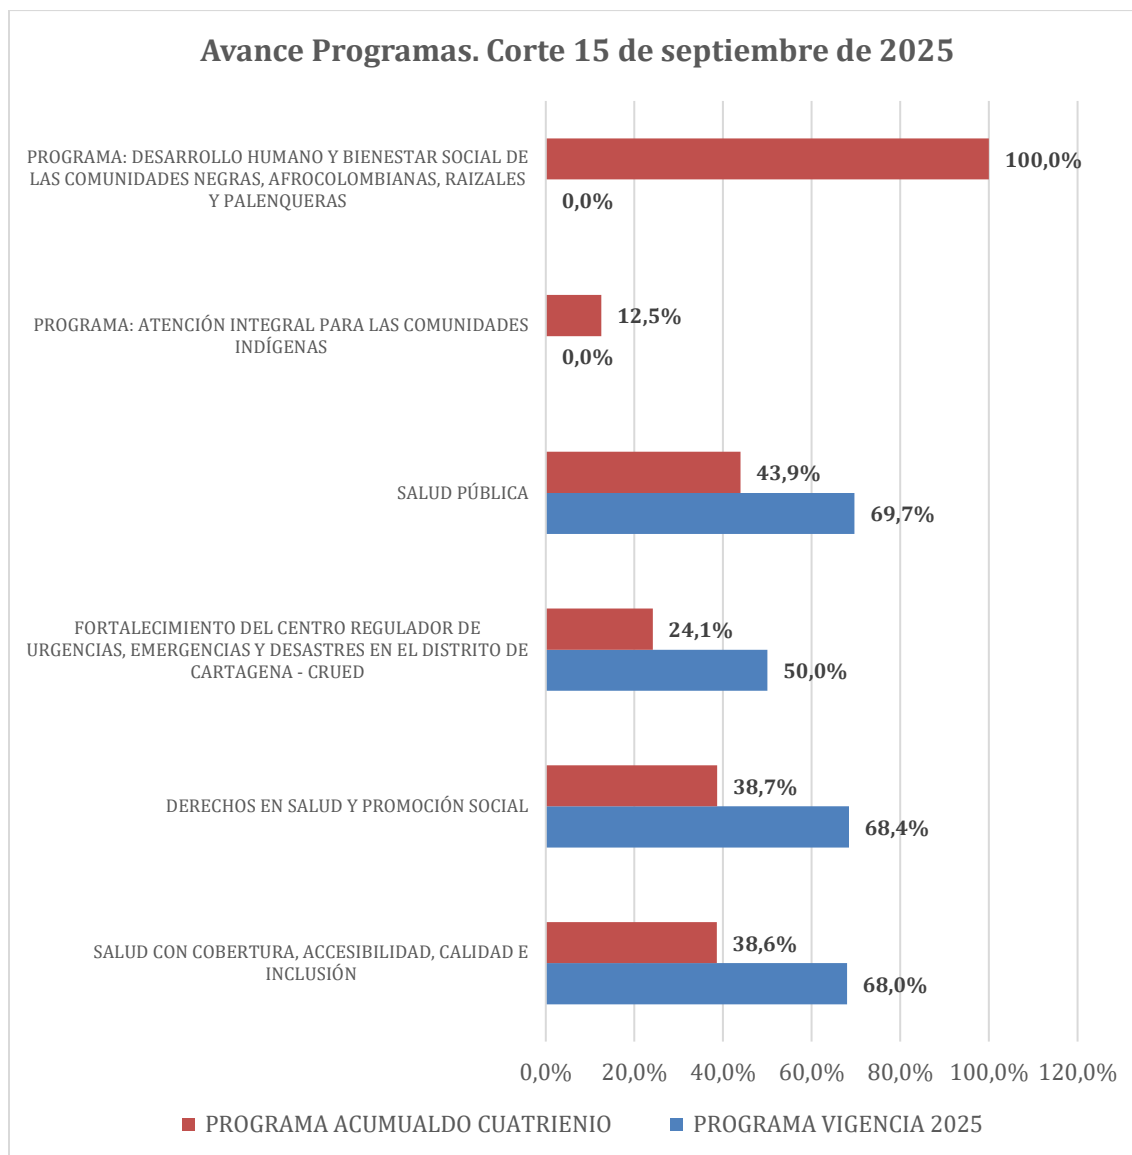

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

Una de las líneas con mejor desempeño fue “Salud Pública”, que alcanzó un avance acumulado del 43,9% y un ponderado del 43,2%, posicionándose como el subcomponente más sólido del periodo. Este resultado fue impulsado por programas de vigilancia epidemiológica, campañas de prevención, acciones de control de enfermedades transmisibles y fortalecimiento de la atención primaria. El Programa ha logrado una cobertura más amplia en comunidades vulnerables, contribuyendo a la capacidad del Distrito para enfrentar desafíos sanitarios de manera más eficaz.



En segundo lugar, el programa “Derechos en Salud y Promoción Social” presentó también un avance destacado, con un 38,7% acumulado y un 39,5% ponderado, resultado que evidencia la consolidación de actividades en promoción de la salud, educación ciudadana, y empoderamiento social para la exigibilidad del derecho a la salud. A través de campañas territoriales y articulación intersectorial, esta línea ha fortalecido la apropiación comunitaria del sistema de salud como un bien público y fundamental.

Por su parte, el programa “Salud con Cobertura, Accesibilidad, Calidad e Inclusión” alcanzó un avance acumulado del 38,6% y un ponderado del 29,5%, reflejando esfuerzos considerables en ampliación de servicios, mejoramiento de infraestructura, y cobertura en sectores históricamente excluidos. Si bien se ha avanzado en el cierre de brechas, persisten desafíos en zonas periurbanas y rurales donde la demanda supera la capacidad instalada, lo cual exige una planeación más precisa y una inversión estratégica.

En contraste, el programa de Fortalecimiento del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUED) continúa mostrando uno de los niveles más bajos de ejecución dentro del componente, con un avance acumulado del 24,1% y un ponderado del 9,7%. Este desempeño limitado refleja debilidades estructurales en infraestructura, dotación tecnológica, talento humano y coordinación operativa. La situación plantea la necesidad urgente de reestructurar la estrategia de fortalecimiento del CRUED para garantizar una respuesta oportuna y eficiente en situaciones de emergencia y desastres.

2.4 Análisis de Metas de Producto Estratégicas

El seguimiento al cumplimiento de las metas estratégicas del DADIS para el periodo 2024–2027, con corte al 15 de septiembre de 2025, permite evidenciar un comportamiento diferencial entre las metas relacionadas con la afiliación y aseguramiento en salud, las acciones de salud pública, la vigilancia sanitaria y las iniciativas de infraestructura. En términos generales, se observa un avance significativo en los componentes operativos y de gestión poblacional, mientras que las metas de inversión en infraestructura física presentan rezagos sustanciales.

En primer lugar, la meta de mantener la continuidad anual de la afiliación al régimen subsidiado en salud, que contempla 679.555 personas afiliadas, registra un cumplimiento de 75,0% para la vigencia 2025 y 44,5% en el acumulado cuatrienal. Estos valores evidencian una gestión sólida en el aseguramiento de la población vulnerable, superando la meta proyectada para el año y garantizando la sostenibilidad del régimen subsidiado. No obstante, se requiere continuar con estrategias de depuración y actualización de bases de datos para mantener la cobertura efectiva y evitar pérdidas por movilidad entre regímenes.

En cuanto a la meta de afiliación de nuevas personas al Sistema General de Seguridad Social en Salud (con o sin SISBEN), el avance alcanza 64,4% en la vigencia y 48,0% en el cuatrienio. Este comportamiento refleja un progreso favorable en la ampliación de la cobertura, aunque se mantiene el reto de captar y vincular a los grupos de población dispersa o con barreras de acceso administrativo, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso.

Por otro lado, la meta de construcción de dos nuevos centros de salud en el Distrito no presenta avances (0% tanto anual como cuatrienal). Este resultado pone de manifiesto un rezago crítico en la dimensión de infraestructura sanitaria, posiblemente asociado a retrasos en procesos contractuales, trámites administrativos o disponibilidad presupuestal. La ausencia de ejecución en este componente limita la capacidad de expansión de los servicios de atención primaria y representa un desafío estructural para el fortalecimiento del sistema de salud distrital.

El objetivo de vincular 30.000 personas en estrategias de promoción de la participación social en salud con paridad de género presenta un cumplimiento de 66,8% en la vigencia y 42,6% en el cuatrienio. Este avance demuestra una implementación activa de mecanismos participativos y de inclusión, con enfoque en poblaciones vulnerables y en la equidad de género, consolidando un eje clave para la gobernanza en salud y la corresponsabilidad ciudadana.

Respecto a las metas de vigilancia y control sanitario, se observan avances diferenciados. En la vigilancia de establecimientos farmacéuticos y similares, se alcanza un 55,14% de ejecución anual y 38,79% cuatrienal, mientras que en la vigilancia de establecimientos y transportadores de alimentos el cumplimiento asciende a 65,0% y 41,2%, respectivamente. Estos resultados reflejan un avance sostenido en las acciones de inspección, vigilancia y control con enfoque de riesgo, aunque la cobertura aún no alcanza los niveles óptimos previstos en el plan, lo que sugiere la necesidad de reforzar capacidades técnicas y operativas del equipo de salud ambiental.

La meta relacionada con la vacunación antirrábica animal evidencia un bajo desempeño, con apenas 8,7% de cumplimiento anual y 27,2% cuatrienal. Este resultado representa una alerta importante en términos de salud pública y control zoonótico, ya que podría comprometer las estrategias de prevención de enfermedades transmisibles entre animales y humanos. Se recomienda reactivar las jornadas masivas de vacunación y fortalecer la articulación interinstitucional con actores comunitarios y entidades territoriales.

Por su parte, la meta de seguimiento anual a la vacunación de niños y niñas menores de un año presenta un avance de 52,7% en la vigencia y 35,0% en el cuatrienio, evidenciando un progreso moderado. Aunque se registra una ejecución operativa significativa, el indicador sugiere la necesidad de mejorar la trazabilidad de los esquemas completos y reforzar las estrategias extramurales para alcanzar una cobertura universal en la primera infancia.

Finalmente, la meta orientada a elaborar acciones de salud pública en entidades sobre prevención y control de la lepra y discapacidad muestra un desempeño sobresaliente, con 74,7% de avance anual y 43,7% cuatrienal. Este resultado denota un fortalecimiento del componente técnico de salud pública y una gestión efectiva en la intervención de enfermedades de baja prevalencia pero alto impacto social.

3. Avances de Proyectos y Ejecución Financiera

3.1 Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión

PROYECTO DE INVERSIÓN	% EJECUTADO ACTIVIDADES DE PROYECTO	VALOR TOTAL VIGENTE POR PROYECTO (SEPTIEMBRE)	PORCENTAJE EJECUTADO SEPTIEMBRE SEGÚN COMPROMISOS	PORCENTAJE EJECUTADO SEPTIEMBRE SEGÚN OBLIGACIONES
Ampliación y continuidad del aseguramiento al régimen subsidiado en salud en el Distrito de Cartagena de Indias	61,8%	1.336.320.878.592	87,4%	57,9%
Desarrollo Institucional del Departamento Administrativo Distrital de Salud del Distrito de Cartagena de Indias	79,4%	5.307.972.525	49,9%	25,5%
Fortalecimiento de la calidad de la atención en salud para la población residente en el Distrito de Cartagena de Indias	54,1%	23.385.887.056	99,9%	31,6%
Control , Vigilancia, Inspección y Promoción del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en el Distrito de Cartagena de Indias	83,8%	1.955.431.129	60,9%	28,1%
Fortalecimiento de la capacidad técnica, tecnológica y de infraestructura del centro regulador de urgencias emergencias y desastres del Distrito de Cartagena de Indias	72,4%	2.014.286.438	69,6%	26,7%
Fortalecimiento de la Promoción y la Participación Social en Salud de los Grupos Poblacionales Vulnerables en el Distrito de Cartagena de Indias	25,8%	2.002.733.093	57,4%	8,6%
Fortalecimiento de la gestión de la salud pública y cuidado de la salud colectiva en el Distrito de Cartagena de Indias	50,7%	911.071.357	73,5%	28,6%
Control y vigilancia de Medicamentos en el Distrito de Cartagena de Indias	44,1%	425.141.733	53,9%	23,0%
Control , inspección y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano y de diversión en el Distrito de Cartagena de Indias	53,5%	740.505.503	74,3%	22,1%
Fortalecimiento del Saneamiento Ambiental y Seguridad Sanitaria en el Distrito de Cartagena de Indias	68,0%	646.706.312	69,4%	29,5%
Prevención y Control de las Zoonosis en el Distrito de Cartagena de Indias	50,7%	1.255.025.870	15,0%	6,6%
Fortalecimiento de la Vigilancia en Salud Pública en el Distrito de Cartagena de Indias	61,1%	1.823.100.000	67,6%	41,7%
Fortalecimiento de los estilos de vida saludable y prevención de las enfermedades no transmisibles en el Distrito de Cartagena de Indias	33,6%	1.185.999.741	37,7%	19,8%



Fortalecimiento de la Promoción y Mantenimiento de la Salud Mental en el Distrito de Cartagena de Indias	60,4%	1.687.675.800	53,3%	19,7%
Fortalecimiento de la nutrición y aprovechamiento biológico de los alimentos de la población del Distrito de Cartagena de Indias	54,4%	440.578.087	90,8%	37,0%
Control y Vigilancia de Alimentos en el Distrito de Cartagena de Indias	54,0%	687.075.429	56,1%	26,3%
Fortalecimiento de la Promoción y Mantenimiento de la Salud Materna y Perinatal en el Distrito de Cartagena de Indias	42,9%	725.500.000	60,2%	14,2%
Fortalecimiento de la Salud Sexual y Reproductiva en el Distrito de Cartagena de Indias	40,0%	1.359.000.000	86,2%	32,1%
Prevención y control de las enfermedades prevenibles por vacunación en el Distrito de Cartagena de Indias	72,3%	1.585.454.000	64,7%	28,6%
Prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores (ETV) en el Distrito de Cartagena de Indias	65,3%	4.444.426.567	55,6%	23,5%
Prevención , Manejo y Control de la Infección Respiratoria Aguda (IRA) y la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en Niños y Niñas en el Distrito de Cartagena de Indias	39,0%	711.073.027	74,6%	33,6%
Fortalecimiento de la Salud Infantil en el Distrito de Cartagena de Indias	62,1%	611.128.777	51,2%	26,6%
Prevención y Control de la Tuberculosis en el Distrito de Cartagena de Indias	38,5%	1.095.109.556	55,6%	12,6%
Prevención y Control de la Lepra en el Distrito de Cartagena de Indias	39,8%	668.178.483	72,8%	21,2%
Fortalecimiento de la promoción de la salud y seguridad en el entorno laboral en el Distrito de Cartagena de Indias	64,8%	556.473.322	87,6%	33,5%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025



Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD CON COBERTURA, ACCESIBILIDAD, CALIDAD E
INCLUSIÓN
PROYECTO: Ampliación y continuidad del aseguramiento al régimen subsidiado en salud en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	61,8%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	87,4%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$ 1.336.320.878.592
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 1.168.276.188.768
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Mantener la continuidad anual de la afiliación a seiscientas setenta y nueve mil quinientas cincuenta y cinco (679.555) personas que están afiliados al régimen subsidiado en salud
Unidad	
Cantidad planeada	679555
Cantidad ejecutada	702.671
Eficacia producto	75%
Meta Producto 2	Afiliar a veinte mil (20.000) personas nuevas al Sistema General de Seguridad Social en Salud (con o sin SISBEN)
Unidad	Número
Cantidad planeada	5000
Cantidad ejecutada	3220
Eficacia producto	64,4%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD CON COBERTURA, ACCESIBILIDAD, CALIDAD E
INCLUSIÓN
PROYECTO: Desarrollo Institucional del Departamento Administrativo Distrital de Salud del
 Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	79,4%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	49,98%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$5.307.972.525
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 2.649.572.651
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Mantener habilitados ciento cuarenta y dos (142) servicios de salud anualmente para la red integrada de salud del Distrito
Unidad	Numero
Cantidad planeada	142
Cantidad ejecutada	142
Eficacia producto	75%
Meta Producto 2	Construir dos (2) nuevos centros de salud en el Distrito para la protección y el aseguramiento en salud
Unidad	Número
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD CON COBERTURA, ACCESIBILIDAD, CALIDAD E INCLUSIÓN

PROYECTO: Fortalecimiento de la calidad de la atención en salud para la población residente en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	54,1%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	100%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$ 23.385.887.056
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 7.389.964.009
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Monitorear y evaluar a sesenta y dos (62) Equipos Básicos de Salud que operan en el Distrito
Unidad	Número
Cantidad planeada	62
Cantidad ejecutada	58
Eficacia producto	93,5%
Meta Producto 2	Inspeccionar, vigilar y controlar a sesenta (60) prestadores de salud para mejoramiento de la calidad de la atención en salud en IPS oncológicas, pediátricas y maternas
Unidad	Número
Cantidad planeada	15
Cantidad ejecutada	16

Eficacia producto	100%
-------------------	------

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : FORTALECIMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA - CRUED
PROYECTO: Fortalecimiento de la capacidad técnica, tecnológica y de infraestructura del centro regulador de urgencias emergencias y desastres del Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	72,4%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	69,6%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$2.014.286.438
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$538.000.000
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Asistir anualmente a veintinueve (29) IPS con servicios del Plan de Emergencia Hospitalaria y desarrollo de capacidades en las competencias frente a las adaptaciones de posibles efectos de la variabilidad y el cambio climático
Unidad	Número
Cantidad planeada	29
Cantidad ejecutada	29
Eficacia producto	100%
Meta Producto 2	Construir y dotar un (1) Centro Regulador de Urgencias y Emergencias con tecnología de punta
Unidad	Número
Cantidad planeada	1

Cantidad ejecutada	1
Eficacia producto	0%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : DERECHOS EN SALUD Y PROMOCIÓN SOCIAL
Proyecto: Fortalecimiento de la Promoción y la Participación Social en Salud de los Grupos Poblacionales Vulnerables en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	25,8%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	57,4%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$ 2.002.733.093
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 173.000.000
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Elaborar valoraciones clínicas multidisciplinaria del procedimiento de certificación de discapacidad y Registro de Localización y Certificación de Personas con Discapacidad a diez mil (10.000) personas del Distrito
Unidad	Número
Cantidad planeada	3.000
Cantidad ejecutada	2.101
Eficacia producto	70%
Meta Producto 2	Vincular a treinta mil (30.000) personas en estrategias de promoción de la participación social en salud con paridad de género (pertenecientes a los grupos poblaciones vulnerables)
Unidad	

Cantidad planeada	7.500
Cantidad ejecutada	5.008
Eficacia producto	66,8%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA

Proyecto: Fortalecimiento de la gestión de la salud pública y cuidado de la salud colectiva en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	57,7%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	73,5%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$ 911.071.357
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 260.250.000
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Implementar cuatro (4) procesos de gestión de la salud pública en el marco de la ruta integral para la promoción y mantenimiento de la salud
Unidad	Número
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	0,65
Eficacia producto	65%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA
Proyecto: Control y vigilancia de Medicamentos en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	44,1%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	53,9%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$ 425.141.733
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 97.867.221,1
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Vigilar y controlar anualmente con enfoque de riesgo a setecientos (700) establecimientos farmacéuticos y similares
Unidad	Número
Cantidad planeada	700
Cantidad ejecutada	386
Eficacia producto	55%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025



LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA
Proyecto: Control, inspección y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano y de diversión en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	53%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	74%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$ 740.505.503
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 163.651.650,9
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Realizar anualmente dos mil cien (2.100) tomas de muestras de agua y visitas a objetos de interés de Inspección, Vigilancia y Control Sanitario (IVCS) de la calidad del agua para consumo humano y de diversión
Unidad	Número
Cantidad planeada	2.100
Cantidad ejecutada	1.404
Eficacia producto	66,9%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE: SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA
Proyecto: Fortalecimiento del Saneamiento Ambiental y Seguridad Sanitaria en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	68%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	69,4%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$ 646.706.312
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 190.847.293,6
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Vigilar y controlar anualmente a siete mil seiscientos (7.600) establecimientos de interés sanitario diferentes a establecimientos de medicamentos y alimentos, incluyendo motonaves y aeronaves
Unidad	Número
Cantidad planeada	7.600
Cantidad ejecutada	7.340
Eficacia producto	96,6%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA

Proyecto: Prevención y Control de las Zoonosis en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	57%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	15%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$ 1.255.025.870
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 83.200.000
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Vacunar anualmente noventa mil (90.000) animales contra la rabia
Unidad	Número
Cantidad planeada	90.000
Cantidad ejecutada	7.848
Eficacia producto	8,7%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA
Proyecto: Fortalecimiento de la Vigilancia en Salud Pública en el Distrito de Cartagena de Indias Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	61,1%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	67,6%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$ 1.823.100.000
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 760.605.000
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Elaborar anualmente acciones de vigilancia en salud pública y vigilancia comunitaria a diecisiete (17) grupos de eventos de interés en salud pública
Unidad	Número
Cantidad planeada	17
Cantidad ejecutada	15
Eficacia producto	88,2%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA
Proyecto: Fortalecimiento de los estilos de vida saludable y prevención de las enfermedades no transmisibles en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	33,6%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	37,7%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$ 1.185.999.741
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 234.393.333
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Desarrollar anualmente acciones de salud pública a doscientas cincuenta (250) entidades en enfermedades cardiovasculares, huérfanas, diabetes mellitus, cáncer, salud visual, auditiva y salud bucal en diferentes entornos
Unidad	Número
Cantidad planeada	250
Cantidad ejecutada	189
Eficacia producto	75,6%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA
Proyecto: Fortalecimiento de la Promoción y Mantenimiento de la Salud Mental en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	60,4%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	53,3%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$ 1.687.675.800
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 332.320.246
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Implementar los diecisiete (17) productos de la Política de Salud Mental y la Política Nacional para la Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas
Unidad	Número
Cantidad planeada	5
Cantidad ejecutada	4
Eficacia producto	80%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025



LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA

Proyecto: Fortalecimiento de la nutrición y aprovechamiento biológico de los alimentos de la población del Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	54,4%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	90,8%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$ 440.578.087
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 163.197.138,9
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Desarrollar anualmente acciones en cuarenta (40) entidades de salud de Rutas Integrales de Atención en Salud relacionadas con las alteraciones nutricionales y promoción de las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABAS)
Unidad	Número
Cantidad planeada	40
Cantidad ejecutada	51
Eficacia producto	100%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA
Proyecto: Control y Vigilancia de Alimentos en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	54%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	56%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$ 687.075.429
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 180.972.628,7
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Vigilar y controlar anualmente con enfoque de riesgo a tres mil quinientos (3.500) establecimientos y transportadores de alimentos
Unidad	Número
Cantidad planeada	3.500
Cantidad ejecutada	2.274
Eficacia producto	65,5%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA

Proyecto: Fortalecimiento de la Promoción y Mantenimiento de la Salud Materna y Perinatal en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	42,9%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	60,2%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$ 725.500.000
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 103.000.000
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Desarrollar anualmente noventa y cinco (95) acciones de salud pública para promoción de la salud materna en entidades de salud y entorno comunitario
Unidad	Número
Cantidad planeada	95
Cantidad ejecutada	51
Eficacia producto	53,7%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA
Proyecto: Fortalecimiento de la Salud Sexual y Reproductiva en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	40%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	86,2%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$ 1.359.000.000
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 436.030.000
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Desarrollar anualmente seiscientos setenta y cinco (675) acciones de salud pública para promoción de la salud sexual y reproductiva en entidades de salud, entorno comunitario y educativo, incluyendo el cumplimiento de sentencias como la C055 de 2022 de la Corte Constitucional
Unidad	Número
Cantidad planeada	675
Cantidad ejecutada	317
Eficacia producto	47,%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA

Proyecto: Prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores (ETV) en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	65,3%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	56,6%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$ 4.444.426.566,76
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 1.046.031.272,7
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Desarrollar anualmente los siete (7) componentes de la Estrategia de Gestión Integrada (EGI) de vectores en los microterritorios priorizados
Unidad	Número
Cantidad planeada	7
Cantidad ejecutada	4,4
Eficacia producto	62,9%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA
Proyecto: Prevención, Manejo y Control de la Infección Respiratoria Aguda (IRA) y la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en Niños y Niñas en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	39%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	74,6%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$ 711.073.027
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 238.627.776,7
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Habilitar treinta (30) salas de atención a atención a enfermedades respiratorias agudas y habilitar dos (2) Unidades de Atención Integral Comunitaria en barrios y corregimientos priorizados para la prevención, manejo y control de la IRA y la EDA en los niños y niñas menores de 5 años
Unidad	Número
Cantidad planeada	8
Cantidad ejecutada	15
Eficacia producto	100%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA
Proyecto: Fortalecimiento de la Salud Infantil en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	62,1%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	51,2%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$ 611.128.777
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 162.430.433,1
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Ejecutar anualmente estrategias de salud infantil institucionales en setenta (70) instituciones prestadoras de salud priorizadas con servicios de atención materno – infantil y atención del recién nacido y ejecutar dos (2) estrategias comunitarias sobre AIEPI Comunitario y Cuidados del Recién Nacido en los diferentes entornos
Unidad	Número
Cantidad planeada	72
Cantidad ejecutada	66
Eficacia producto	91,7%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA

Proyecto: Prevención y Control de la Tuberculosis en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	38,5%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	55,6%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$ 1.095.109.556
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 137.674.183,3
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Elaborar anualmente acciones de salud pública en setenta y cinco (75) entidades sobre prevención y control de la tuberculosis en los diferentes entornos
Unidad	
Cantidad planeada	75
Cantidad ejecutada	52
Eficacia producto	69,3%

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA

Proyecto: Prevención y Control de la Lepra en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	39,8%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	72,8%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$ 668.178.483
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 141.912.778
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Elaborar anualmente acciones de salud pública en setenta y cinco (75) entidades sobre prevención y control de la lepra y prevención de la discapacidad en los diferentes entornos
Unidad	Número
Cantidad planeada	75
Cantidad ejecutada	56
Eficacia producto	74,7%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

LINEA ESTRATEGICA : VIDA DIGNA
IMPULSOR DE AVANCE : SALUD PÚBLICA Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA : SALUD PÚBLICA


Proyecto: Fortalecimiento de la promoción de la salud y seguridad en el entorno laboral en el Distrito de Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 15 de 2025	64,8%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 15 de 2025	87,6%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$ 556.473.322
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 186.311.996,6
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Elaborar setecientos veinte (720) acciones de promoción de entornos de trabajo seguros y prevención de enfermedades y accidentes laborales
Unidad	Número
Cantidad planeada	180
Cantidad ejecutada	127
Eficacia producto	70,6%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025



3.2 Ejecución Presupuestal

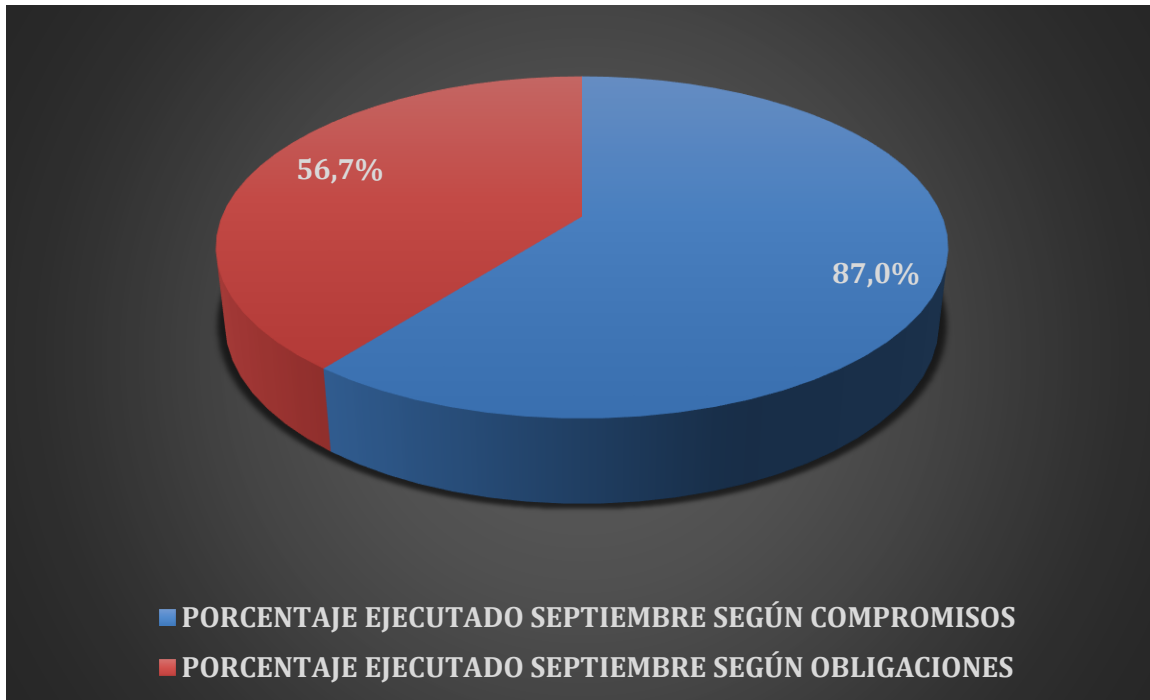

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 2025

Con corte al 30 de septiembre de 2025, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS) presentó un comportamiento presupuestal que evidenció avances significativos en la ejecución de compromisos, acompañado de un nivel de ejecución en obligaciones que, aunque positivo, aún requiere fortalecimiento para alcanzar un cierre fiscal equilibrado.

El monto total comprometido alcanzó la cifra de \$1.211.004.240.658, lo que representa un 87,0 % de ejecución frente al presupuesto asignado. Este resultado refleja una planificación financiera activa y una gestión administrativa orientada a garantizar la disponibilidad oportuna de los recursos para el desarrollo de los programas y proyectos misionales del sector salud en el Distrito de Cartagena.

El alto nivel de compromisos indica que el DADIS adelantó con antelación los procesos contractuales, administrativos y técnicos necesarios para asegurar la continuidad de las estrategias de atención en salud pública, la prestación de servicios, la vigilancia epidemiológica, y las acciones de promoción y prevención en las comunidades. Este comportamiento evidencia una buena capacidad de programación del gasto, aspecto clave para evitar rezagos en la ejecución presupuestal hacia el cierre de la vigencia fiscal.

No obstante, al analizar la ejecución de las obligaciones presupuestales, el panorama resulta más moderado. El monto ejecutado en obligaciones ascendió a \$788.901.899.063,

equivalente al 56,7 % del presupuesto asignado. Esto significa que, aunque una proporción considerable de los recursos ya se encontraba comprometida, poco más de la mitad se había traducido en obligaciones efectivas, lo cual refleja un rezago en la materialización financiera de los compromisos adquiridos.

La brecha existente entre compromisos y obligaciones (87,0 % vs. 56,7 %) constituye un indicador clave para la gestión presupuestal. Esta diferencia sugiere que, si bien los recursos se han orientado a programas específicos, una parte importante aún no se ha convertido en gasto real que beneficie directamente a la comunidad. Esta situación representa un riesgo potencial de acumulación de saldos sin ejecutar hacia el cierre de la vigencia, lo que podría generar presiones administrativas y operativas durante los últimos meses del año fiscal.

REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL (COMPROMISOS) SEPTIEMBRE 2025	% EJECUCION COMPROMISOS SEPTIEMBRE 2025	REPORTE EJECUCION PRESUPUESTAL (OBLIGACIONES) SEPTIEMBRE 2025	% EJECUCION OBLIGACIONES SEPTIEMBRE 2025
\$ 1.211.004.240.658	87,0%	\$ 788.901.899.063	56,7%

4. Conclusiones y Recomendaciones

Ninguna
